No.1
FH 9.853
GH 9.853
9.50

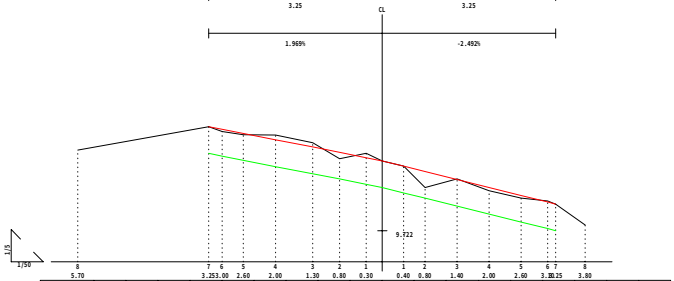

No.	8	7	6	5	4	3	2	1	CL	CL	1	2	3	4	5	6	7	8
計画値		9.917	9.912	9.906	9.899	9.879	9.869	9.857	9.853	9.853	9.843	9.833	9.818	9.803	9.788	9.775	9.772	
切削値		9.862	9.862	9.854	9.842	9.829	9.819	9.809	9.853	9.853	9.753	9.783	9.788	9.803	9.788	9.726	9.772	
実測値	9.873	9.917	9.908	9.902	9.901	9.887	9.857	9.867	9.853	9.853	9.843	9.803	9.819	9.797	9.783	9.778	9.772	9.733
厚 さ		50	46	48	59	58	38	58	50	50	50	29	51	44	45	52	50	
距 離		2.45	0.25	0.40	0.60	0.70	0.50	0.50	0.30		0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.50	0.15	0.55
平均厚(切土)			0.048	0.047	0.054	0.059	0.048	0.048	0.054		0.050	0.035	0.036	0.048	0.045	0.049	0.051	
平均厚(盛土)			0.052	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050		0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.053	
断面積(切土)			0.012	0.039	0.032	0.041	0.024	0.024	0.016		0.020	0.014	0.022	0.029	0.027	0.025	0.008	
断面積(盛土)			0.013	0.020	0.030	0.035	0.025	0.025	0.015		0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.025	0.008	

左断面積(切土) 0.168 左断面積(盛土) 0.163 平均切削厚 0.040
右断面積(切土) 0.145 右断面積(盛土) 0.163 平均ｷﾞﾘｰﾝｸﾞ厚 0.050
断面積(切土) 0.313 断面積(盛土) 0.326

No.2
FH 9.626
GH 9.626
9.30

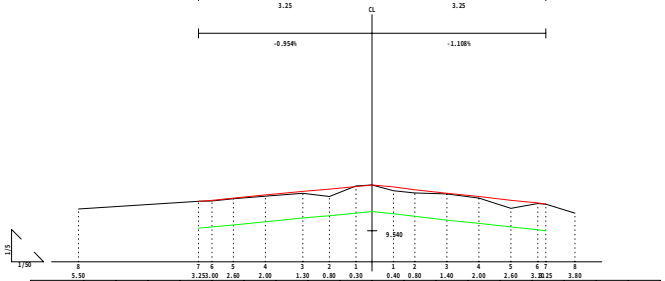

No.	8	7	6	5	4	3	2	1	CL	CL	1	2	3	4	5	6	7	8
計画値		9.599	9.597	9.601	9.607	9.614	9.618	9.624	9.626	9.626	9.620	9.612	9.617	9.610	9.604	9.597	9.592	9.590
切削値		9.549	9.547	9.551	9.557	9.564	9.568	9.573	9.576	9.576	9.572	9.567	9.560	9.554	9.547	9.542	9.540	
実測値	9.581	9.599	9.596	9.600	9.605	9.610	9.604	9.624	9.626	9.626	9.615	9.611	9.609	9.601	9.582	9.591	9.590	9.573
厚 さ		50	49	49	48	44	34	51	50	50	43	44	49	47	35	49	50	
距 離		2.25	0.25	0.40	0.60	0.70	0.50	0.50	0.30		0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.50	0.15	0.55
平均厚(切土)			0.050	0.049	0.049	0.047	0.041	0.044	0.051		0.047	0.044	0.047	0.048	0.041	0.042	0.050	
平均厚(盛土)			0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050		0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.053	
断面積(切土)			0.013	0.020	0.029	0.033	0.021	0.022	0.015		0.019	0.018	0.028	0.029	0.025	0.021	0.008	
断面積(盛土)			0.013	0.020	0.030	0.035	0.025	0.025	0.015		0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.025	0.008	

左断面積(切土) 0.153 左断面積(盛土) 0.163 平均切削厚 0.046
右断面積(切土) 0.148 右断面積(盛土) 0.163 平均ｷﾞﾘｰﾝｸﾞ厚 0.050
断面積(切土) 0.301 断面積(盛土) 0.326

No.3+10.00
FH 8.914
GH 8.914
8.15

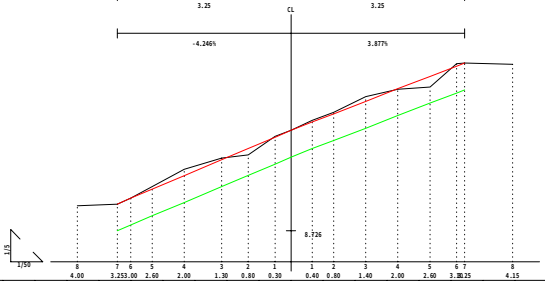

No.	8	7	6	5	4	3	2	1	CL	CL	1	2	3	4	5	6	7	8
計画値		8.776	8.787	8.804	8.826	8.859	8.880	8.903	8.914	8.914	8.930	8.945	8.959	8.972	8.983	8.993	9.034	9.040
切削値		8.726	8.737	8.754	8.776	8.809	8.830	8.853	8.864	8.864	8.880	8.895	8.909	8.922	8.933	8.943	8.984	8.990
実測値	8.773	8.776	8.787	8.809	8.841	8.862	8.868	8.903	8.914	8.914	8.933	8.948	8.977	8.993	8.995	9.039	9.040	9.038
厚 さ		50	50	55	62	53	38	52	50	50	53	53	59	49	38	55	50	
距 離		0.75	0.25	0.40	0.60	0.70	0.50	0.50	0.30		0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.50	0.15	0.90
平均厚(切土)			0.050	0.053	0.059	0.058	0.046	0.040	0.051		0.052	0.053	0.056	0.054	0.040	0.043	0.053	
平均厚(盛土)			0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050		0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.053	
断面積(切土)			0.013	0.021	0.035	0.041	0.023	0.023	0.015		0.021	0.021	0.034	0.032	0.024	0.022	0.008	
断面積(盛土)			0.013	0.020	0.030	0.035	0.025	0.025	0.015		0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.025	0.008	

左断面積(切土) 0.171 左断面積(盛土) 0.163 平均切削厚 0.054
右断面積(切土) 0.162 右断面積(盛土) 0.163 平均ｷﾞﾘｰﾝｸﾞ厚 0.050
断面積(切土) 0.333 断面積(盛土) 0.326

No.0+10.00
FH 9.900
GH 9.900
7.60

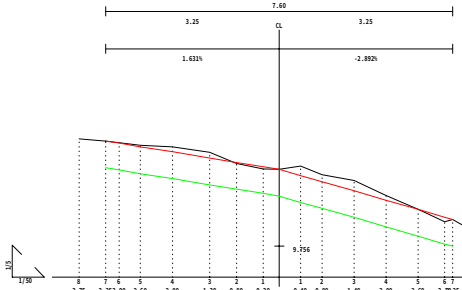

No.	8	7	6	5	4	3	2	1	CL	CL	1	2	3	4	5	6	7	8
計画値		9.953	9.949	9.942	9.933	9.921	9.913	9.905	9.900	9.900	9.888	9.877	9.869	9.862	9.855	9.848	9.844	
切削値		9.903	9.899	9.892	9.883	9.871	9.863	9.855	9.850	9.850	9.838	9.827	9.819	9.812	9.805	9.798	9.794	
実測値	9.957	9.953	9.950	9.945	9.942	9.932	9.911	9.903	9.900	9.900	9.906	9.890	9.879	9.851	9.825	9.802	9.806	9.772
厚 さ		50	51	53	59	61	48	48	50	50	68	63	69	59	50	42	50	
距 離		0.50	0.25	0.40	0.60	0.70	0.50	0.50	0.30		0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.50	0.15	0.60
平均厚(切土)			0.051	0.052	0.056	0.060	0.055	0.047	0.048		0.059	0.066	0.066	0.064	0.055	0.046	0.046	
平均厚(盛土)			0.052	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050		0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.053	
断面積(切土)			0.013	0.021	0.030	0.041	0.028	0.024	0.014		0.024	0.028	0.040	0.038	0.033	0.023	0.007	
断面積(盛土)			0.013	0.020	0.030	0.035	0.025	0.025	0.015		0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.025	0.008	

左断面積(切土) 0.176 左断面積(盛土) 0.163 平均切削厚 0.056
右断面積(切土) 0.191 右断面積(盛土) 0.163 平均ｷﾞﾘｰﾝｸﾞ厚 0.050
断面積(切土) 0.367 断面積(盛土) 0.326

No.1+15.50
FH 9.713
GH 9.713
9.60

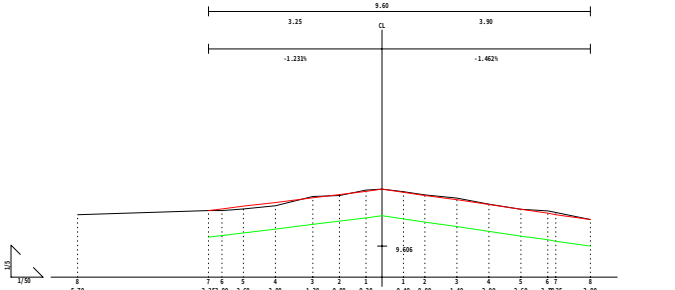

No.	8	7	6	5	4	3	2	1	CL	CL	1	2	3	4	5	6	7	8
計画値		9.673	9.676	9.681	9.688	9.697	9.703	9.709	9.713	9.713	9.707	9.701	9.693	9.686	9.679	9.668	9.665	9.656
切削値		9.623	9.626	9.631	9.638	9.647	9.653	9.659	9.663	9.663	9.657	9.651	9.643	9.636	9.629	9.618	9.615	9.606
実測値	9.665	9.673	9.673	9.676	9.682	9.689	9.701	9.711	9.713	9.713	9.708	9.702	9.696	9.685	9.675	9.672	9.669	9.656
厚 さ		50	47	45	44	52	48	52	50	50	51	51	51	52	51	50	54	50	50
距 離		2.45	0.25	0.40	0.60	0.70	0.50	0.50	0.30		0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.50	0.15	0.65
平均厚(切土)			0.049	0.046	0.045	0.048	0.050	0.050	0.051		0.051	0.051	0.052	0.052	0.051	0.052	0.054	0.052
平均厚(盛土)			0.052	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050		0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.053	0.051
断面積(切土)			0.012	0.018	0.017	0.024	0.025	0.025	0.015		0.020	0.020	0.031	0.031	0.031	0.026	0.008	0.034
断面積(盛土)			0.013	0.020	0.030	0.035	0.025	0.025	0.015		0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.025	0.008	0.033

左断面積(切土) 0.156 左断面積(盛土) 0.163 平均切削厚 0.050
右断面積(切土) 0.201 右断面積(盛土) 0.196 平均ｷﾞﾘｰﾝｸﾞ厚 0.050
断面積(切土) 0.357 断面積(盛土) 0.359

No.3
FH 9.183
GH 9.183
7.80

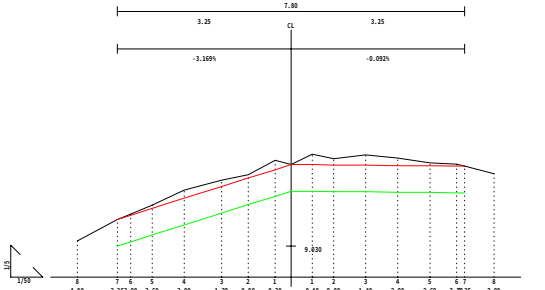

No.	8	7	6	5	4	3	2	1	CL	CL	1	2	3	4	5	6	7	8
計画値		9.080	9.088	9.101	9.120	9.142	9.159	9.173	9.183	9.183	9.182	9.182	9.182	9.182	9.182	9.180	9.180	
切削値		9.030	9.038	9.051	9.070	9.092	9.109	9.123	9.133	9.133	9.132	9.132	9.132	9.132	9.132	9.130	9.130	
実測値	9.040	9.080	9.090	9.107	9.135	9.154	9.164	9.191	9.183	9.183	9.202	9.194	9.201	9.195	9.186	9.184	9.180	9.166
厚 さ		50	52	56	65	62	56	68	50	50	68	62	69	64	55	54	50	50
距 離		0.75	0.25	0.40	0.60	0.70	0.50	0.50	0.30		0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.50	0.15	0.55
平均厚(切土)			0.051	0.054	0.061	0.064	0.059	0.062	0.059		0.060	0.066	0.066	0.067	0.060	0.055	0.052	
平均厚(盛土)			0.052	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050		0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.053	
断面積(切土)			0.013	0.022	0.037	0.045	0.030	0.031	0.018		0.024	0.026	0.040	0.040	0.036	0.028	0.008	
断面積(盛土)			0.013	0.020	0.030	0.035	0.025	0.025	0.015		0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.025	0.008	

左断面積(切土) 0.196 左断面積(盛土) 0.163 平均切削厚 0.061
右断面積(切土) 0.202 右断面積(盛土) 0.163 平均ｷﾞﾘｰﾝｸﾞ厚 0.050
断面積(切土) 0.398 断面積(盛土) 0.326

No.0
FH 9.918
GH 9.918
7.60

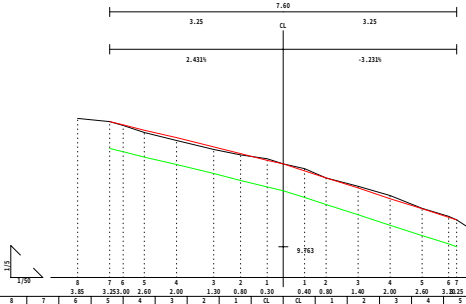

No.	8	7	6	5	4	3	2	1	CL	CL	1	2	3	4	5	6	7	8
計画値		9.997	9.991	9.981	9.967	9.950	9.937	9.925	9.918	9.918	9.905	9.892	9.873	9.853	9.834	9.818	9.813	
切削値		9.947	9.941	9.931	9.917	9.900	9.887	9.875	9.868	9.868	9.855	9.842	9.823	9.803	9.784	9.768	9.763	
実測値	10.002	9.997	9.990	9.977	9.962	9.945	9.935	9.926	9.918	9.918	9.909	9.892	9.876	9.859	9.835	9.820	9.813	9.780
厚 さ		50	49	46	45	45	48	53	50	50	54	50	53	56	51	52	50	
距 離		0.60	0.25	0.40	0.60	0.70	0.50	0.50	0.30		0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.50	0.15	0.50
平均厚(切土)			0.050	0.048	0.046	0.045	0.047	0.051	0.052		0.052	0.052	0.052	0.055	0.054	0.052	0.051	
平均厚(盛土)			0.052	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050		0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.053	
断面積(切土)			0.013	0.019	0.028	0.032	0.024	0.026	0.016		0.021	0.021	0.031	0.033	0.032	0.026	0.008	
断面積(盛土)			0.013	0.020	0.030	0.035	0.025	0.025	0.015		0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.025	0.008	

左断面積(切土) 0.158 左断面積(盛土) 0.163 平均切削厚 0.051
右断面積(切土) 0.172 右断面積(盛土) 0.163 平均ｷﾞﾘｰﾝｸﾞ厚 0.050
断面積(切土) 0.330 断面積(盛土) 0.326

No.1+10.00
FH 9.761
GH 9.761
9.75

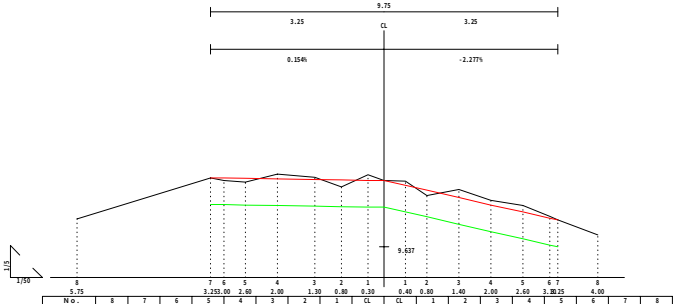

No.	8	7	6	5	4	3	2	1	CL	CL	1	2	3	4	5	6	7	8
計画値		9.766	9.766	9.765	9.764	9.763	9.762	9.761	9.761	9.761	9.752	9.743	9.729	9.715	9.702	9.690	9.687	
切削値		9.716	9.716	9.715	9.714	9.713	9.712	9.711	9.711	9.711	9.702	9.693	9.679	9.665	9.652	9.640	9.637	
実測値	9.689	9.766	9.761	9.758	9.773	9.767	9.749	9.772	9.761	9.761	9.760	9.733	9.744	9.724	9.714	9.694	9.687	9.639
厚 さ		50	45	43	59	54	37	61	50	50	58	40	65	59	62	54	50	
距 離		2.50	0.25	0.40	0.60	0.70	0.50	0.50	0.30		0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.50	0.15	0.75
平均厚(切土)			0.048	0.044	0.051	0.057	0.046	0.049	0.050		0.054	0.049	0.063	0.062	0.061	0.058	0.052	
平均厚(盛土)			0.052	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050		0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.053	
断面積(切土)			0.012	0.018	0.031	0.040	0.023	0.025	0.017		0.022	0.020	0.032	0.037	0.037	0.029	0.008	
断面積(盛土)			0.013	0.020	0.030	0.035	0.025	0.025	0.015		0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.025	0.008	

左断面積(切土) 0.166 左断面積(盛土) 0.163 平均切削厚 0.054
右断面積(切土) 0.185 右断面積(盛土) 0.163 平均ｷﾞﾘｰﾝｸﾞ厚 0.050
断面積(切土) 0.351 断面積(盛土) 0.326

No.2+10.00
FH 9.434
GH 9.434
9.15

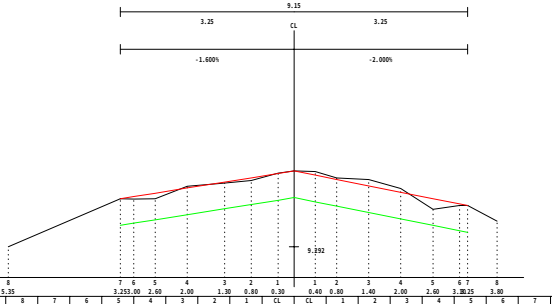

No.	8	7	6	5	4	3	2	1	CL	CL	1	2	3	4	5	6	7	8
計画値		9.382	9.386	9.392	9.402	9.413	9.421	9.429	9.434	9.434	9.426	9.418	9.406	9.394	9.383	9.372	9.369	
切削値		9.332	9.336	9.342	9.352	9.363	9.371	9.379	9.384	9.384	9.376	9.368	9.356	9.344	9.333	9.322	9.319	
実測値	9.292	9.382	9.383	9.392	9.405	9.413	9.436	9.430	9.434	9.434	9.433	9.421	9.418	9.403	9.362	9.369	9.369	9.340
厚 さ		50	45	40	53	48	45	51	50	50	57	53	62	57	39	47	50	
距 離		2.10	0.25	0.40	0.60	0.70	0.50	0.50	0.30		0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.50	0.15	0.55
平均厚(切土)			0.048	0.043	0.047	0.051	0.047	0.048	0.051		0.054	0.055	0.058	0.060	0.048	0.039	0.049	
平均厚(盛土)			0.052	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050		0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.050	0.053	
断面積(切土)			0.012	0.017	0.028	0.036	0.024	0.024	0.015		0.022	0.022	0.035	0.036	0.026	0.020	0.007	
断面積(盛土)			0.013	0.020	0.030	0.035	0.025	0.025	0.015		0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.025	0.008	

左断面積(切土) 0.156 左断面積(盛土) 0.163 平均切削厚 0.050
右断面積(切土) 0.168 右断面積(盛土) 0.163 平均ｷﾞﾘｰﾝｸﾞ厚 0.050
断面積(切土) 0.324 断面積(盛土) 0.326
